









## 工程主辦機關工程督導紀錄

工程名稱	法務部矯正署彰化看守所遷建統包工程			
主辦機關	法務部矯正署彰化看守所	督導日期	110年6月16日	
監造廠商	王騰建築師事務所	相關廠商 (專案管理)	正堯工程顧問有限股份公司	
承攬統包廠商	宏昇營造股份有限公司 姜樂靜建築師事務所 怡佑有限公司 順晟科技企業有限公司	督導人員	 <small>(委員簽名)</small>	
工程執行進度	預定進度	1.6262%	實際進度	4.2066%
目前施工概況	主體工區洗車池及休息區整地。			
督導重點項目	一、承商及監造單位到場人員(如出勤簽到記錄等) 督導情形： (一)監造廠商：專管經理、監造主任、專管助理、監造品管人員在工地執行任務。 (二)統包廠商：工地負責人、品管人員、勞工安全衛生人員在工地執行職務。			
	二、承商及監造單位品質文件記錄管理(如材料試驗、自主檢查、監造日誌、缺失改善等) 督導情形： (一)監造廠商：職安衛管理(土地環境保護、工地安全衛生)、施工查驗(測量放樣工程、假設工程)確實記錄管理、其餘尚未開始施工項目已列冊。 (二)統包廠商：每週提送施工日誌至本機關備查。			
	三、安衛環境管理(如告示牌、圍籬、警示燈帶、鷹架、開口警示、衛生設備、道路清潔等) 督導情形： 統包廠商： 1. 工程告示牌已設置，並設置於工地入口明顯處。			
	四、結構設備施工品質(如混凝土鋼筋模版品質及完成面平整度及美觀性等) 督導情形： 統包廠商：經檢視工區，無異常。			
	五、其他(如居民反映、鄰房處理、變更設計需求等) 督導情形：無。			

<p>對承攬統包廠商 指示事項</p>	<p>指示事項： 文件資料：請持續依規定辦理送審、紀錄及存查。 現場施工：請持續控管安全、品質及進度管理。 缺失改善期限：限定 年 月 日提報</p>	<p>承商簽認</p>	<p><b>工地黃炫肇</b> 主任黃炫肇 (工地主任)</p>
<p>對監造廠商 指示事項</p>	<p>指示事項： 文件資料：請持續依規定辦理審查、紀錄及存查。 現場監造：請持續督促統包廠商辦理安全、品質及進度 控管。 缺失改善期限：限定 年 月 日提報</p>	<p>監造簽認</p>	<p><b>監造王仁和</b> 主任王仁和 (監造主任)</p>
<p>主辦機關核章</p>	<p>承辦人員 總務科長 機關首長</p> <p><b>管理員許晏豪</b>      <b>總務科長張錦倉</b>      <b>所長</b>  <small>附 7. -1</small>  <b>吳永琛</b></p>		

## 工程主辦機關工程督導紀錄

工程名稱	法務部矯正署彰化看守所遷建統包工程			
主辦機關	法務部矯正署彰化看守所	督導日期	110年6月22日 時	
監造廠商	王騰建築師事務所	相關廠商 (專案管理)	正堯工程顧問有限股份公司	
承攬統包廠商	宏昇營造股份有限公司 姜樂靜建築師事務所 怡佑有限公司 順晟科技企業有限公司	督導人員	張錫倉  (委員簽名)	
工程執行進度	預定進度	1.7218 %	實際進度	4.3022 %
目前施工概況	<p>一、主體工區：</p> <p>1. 洗車台及沈澱池施作。</p> <p>2. 彰化監獄停車棚屋頂設置烤漆鋼板(早上工班進場施工後因雨下午休息)。</p> <p>二、懇親宿舍工區：1F 機電設備配管(早上工班進場施工後因雨下午休息)。</p>			
督導重點項目	<p>一、承商及監造單位到場人員(如出勤簽到記錄等)</p> <p>督導情形：</p> <p>(一)監造廠商：專管經理、監造主任、專管助理、監造品管人員在工地執行任務。</p> <p>(二)統包廠商：工地負責人、品管人員、勞工安全衛生人員在工地執行職務。</p>			
	<p>二、承商及監造單位品質文件記錄管理(如材料試驗、自主檢查、監造日誌、缺失改善等)</p> <p>督導情形：</p> <p>(一)監造廠商：經抽查監造報表確實記錄，尚無不妥。</p> <p>(二)統包廠商：經抽查施工日誌確實記錄，尚無不妥。</p>			
	<p>三、安衛環境管理(如告示牌、圍籬、警示燈帶、鷹架、開口警示、衛生設備、道路清潔等)</p> <p>督導情形：</p> <p>統包廠商：經巡查工地現場，配管材料及機具未妥善收拾。</p>			
	<p>四、結構設備施工品質(如混凝土鋼筋模版品質及完成面平整度及美觀性等)</p> <p>督導情形：</p> <p>統包廠商：天雨，下午無施工。</p>			
	<p>五、其他(如居民反映、鄰房處理、變更設計需求等)</p> <p>督導情形：無。</p>			

對承攬統包廠商 指示事項	指示事項： 經巡查工地現場，配管材料及機具未妥善收拾。  缺失改善期限：限定 110 年 6 月 22 日提報	承商 簽認	  (工地主任)
對監造廠商 指示事項	指示事項： 文件資料：請持續依規定辦理審查、紀錄及存查。 現場監造：請持續督促統包廠商辦理安全、品質及進度控管。  缺失改善期限：限定      年      月      日提報	監造 簽認	  (監造主任)
主辦機關核章	承辦人員  總務科長  機關首長		



缺失改善照片表（改善前、中、後同一角度拍攝）



說明：

改善前-經巡查工地現場，配管材料及機具未妥善收拾。



說明：


改善中-立即派員整理，恢復工地清潔。








說明：

改善後-整理完成。

## 工程主辦機關工程督導紀錄

工程名稱	法務部矯正署彰化看守所遷建統包工程			
主辦機關	法務部矯正署彰化看守所	督導日期	110年6月29日 時	
監造廠商	王騰建築師事務所	相關廠商 (專案管理)	正堯工程顧問有限股份公司	
承攬統包廠商	宏昇營造股份有限公司 姜樂靜建築師事務所 怡佑有限公司 順晟科技企業有限公司	督導人員	 <small>(委員簽名)</small>	
工程執行進度	預定進度	1.8333 %	實際進度	4.4137 %
目前施工概況	一、主體工區： 1. 主體工區洗車池鋼筋綁紮。			
督導重點項目	一、承商及監造單位到場人員（如出勤簽到記錄等） 督導情形： （一）監造廠商：專管經理、監造主任、專管助理、監造品管人員在工地執行任務。 （二）統包廠商：工地負責人、品管人員、勞工安全衛生人員在工地執行職務。			
	二、承商及監造單位品質文件記錄管理（如材料試驗、自主檢查、監造日誌、缺失改善等） 督導情形： （一）監造廠商：經抽查監造報表確實記錄，尚無不妥；另抽查本週計畫主持人及協同主持人到場服務紀錄，確實依契約辦理。 （二）統包廠商：經抽查施工日誌確實記錄，尚無不妥。			
	三、安衛環境管理（如告示牌、圍籬、警示燈帶、鷹架、開口警示、衛生設備、道路清潔等） 督導情形： 統包廠商：經巡查懇親宿舍大樓工地現場，1只臨時用電開關箱未上鎖。			
	四、結構設備施工品質（如混凝土鋼筋模版品質及完成面平整度及美觀性等） 督導情形： 統包廠商：無異樣。			
	五、其他（如居民反映、鄰房處理、變更設計需求等） 督導情形：無。			

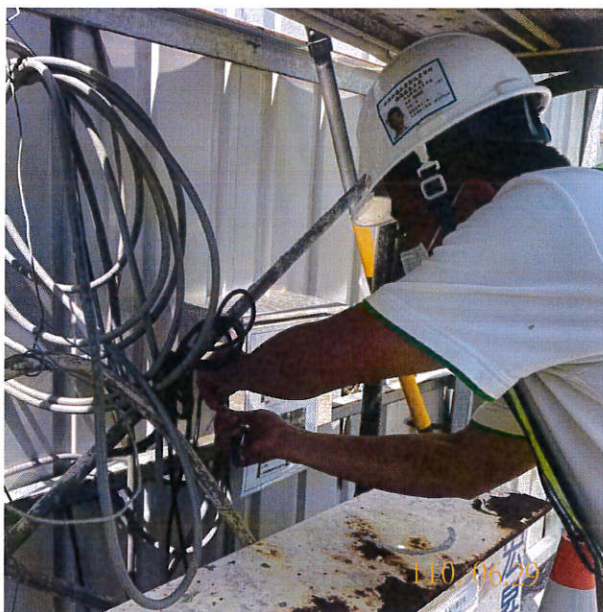
<p>對承攬統包廠商 指示事項</p>	<p>指示事項： 懇親宿舍大樓工地現場，1 只臨時用電開關箱未上鎖。 已告知統包廠商立即改善。 缺失改善期限：限定 110 年 6 月 29 日提報</p>	<p>承商簽認</p>	<p>工地主任黃炫筆  (工地主任)</p>
<p>對監造廠商 指示事項</p>	<p>指示事項： 文件資料：請持續依規定辦理審查、紀錄及存查。 現場監造：請持續督促統包廠商辦理安全、品質及進度控管。 缺失改善期限：限定 年 月 日提報</p>	<p>監造簽認</p>	<p>監造主任王仁和  (監造主任)</p>
<p>主辦機關核章</p>	<p>承辦人員 總務科長 機關首長</p> <p>  </p>		



缺失改善照片表 (改善前、中、後同一角度拍攝)



說明：  
改善前-臨時用電開關箱未上鎖。




說明：  
改善中-派員加裝，於無人使用時皆處上鎖狀態。








說明：  
改善後-下班前檢查，已上鎖。



## 工程主辦機關工程督導紀錄

工程名稱	法務部矯正署彰化看守所遷建統包工程			
主辦機關	法務部矯正署彰化看守所	督導日期	110年7月8日 15:00時	
監造廠商	王騰建築師事務所	相關廠商 (專案管理)	正堯工程顧問有限公司	
承攬統包廠商	宏昇營造股份有限公司 姜樂靜建築師事務所 怡佑有限公司 順晟科技企業有限公司	督導人員	 <small>(委員簽名)</small>	
工程執行進度	預定進度	1.9767%	實際進度	4.5571%
目前施工概況	懇親宿舍 1F 地坪鋼筋綁紮前整理。			
督導重點項目	一、承商及監造單位到場人員 (如出勤簽到記錄等) 督導情形： (一) 監造廠商：專案經理、監造主任、專管助理、監造工程師在工地執行任務。 (二) 統包廠商：工地負責人、品管人員、勞工安全衛生人員在工地執行職務。			
	二、承商及監造單位品質文件記錄管理 (如材料試驗、自主檢查、監造日誌、缺失改善等) 督導情形： (一) 監造廠商：職安衛管理(土地環境保護、工地安全衛生)、施工查驗確實記錄管理、其餘尚未開始施工項目已列冊。 (二) 統包廠商：放樣工程、假設工程、鋼筋工程自主檢查表確實記錄管理，每週提送施工日誌至本機關備查。			
	三、安衛環境管理 (如告示牌、圍籬、警示燈帶、鷹架、開口警示、衛生設備、道路清潔等) 督導情形： 統包廠商： 1. 依遷建工程督導小組-衛生科工地安全衛生檢查表檢視，檢查結果無異常情形。(詳如附件)			
	四、結構設備施工品質 (如混凝土鋼筋模版品質及完成面平整度及美觀性等) 督導情形： 統包廠商：懇親宿舍 1F 地坪鋼筋綁紮前整理。。			
	五、其他 (如居民反映、鄰房處理、變更設計需求等) 督導情形：無。			

<p>對承攬統包廠商 指示事項</p>	<p>指示事項： 文件資料：請持續依規定辦理送審、紀錄及存查。 現場施工：請持續控管安全、品質及進度管理。 缺失改善期限：限定 年 月 日提報</p>	<p>承商簽認</p>	<p>工地主任黃炫肇  (工地主任)</p>
<p>對監造廠商 指示事項</p>	<p>指示事項： 文件資料：請持續依規定辦理審查、紀錄及存查。 現場監造：請持續督促統包廠商辦理安全、品質及進度控管。 缺失改善期限：限定 年 月 日提報</p>	<p>監造簽認</p>	<p>監造主任王仁和  (監造主任)</p>
<p>主辦機關核章</p>	<p>承辦人員  總務科長  機關首長 </p>		


## 法務部矯正署彰化看守所

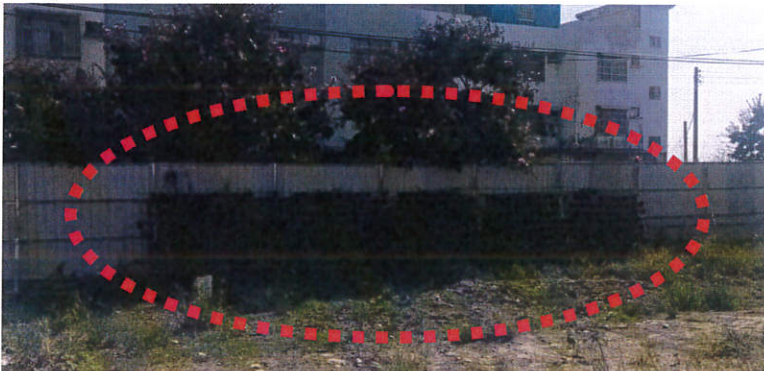
### 遷建工程督導小組 - 衛生科工地安全衛生檢查表

檢查日期	110年7月09日	檢查人員	陳培智 0708
統包單位	宏昇營造股份有限公司	監造單位	王騰建築師事務所
專管單位	正堯工程顧問股份有限公司	檢查地點	<input type="checkbox"/> 彰化看守所建地 <input type="checkbox"/> 懇親宿舍
項目	檢查事項	檢查情況	備註
人員 清點 及 門禁 管制	1 工區人員簽到點名是否確實?	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 加強檢查
	2 現場工作人員是否配戴安全帽?	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 加強檢查
	3 物料、機具及車輛進出是否依照規定申請進入?	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 加強檢查
	4 工地圍籬是否完整，無隨意拆卸及損壞情形?	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 加強檢查
	5 工區出入口是否設置警示標誌，夜間圍籬警示燈是否正常?	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 加強檢查
現場 作業 及 安全 管制	1 現場人員管控是否確實?	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 加強檢查
	2 是否有訓練合格之作業主管在場監督?(如露天開挖、擋土支撐...等)	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 加強檢查
	3 作業區周邊應有妥善之警示及安全措施(安全欄杆、警示措施、防護具或防止坍塌等措施)?	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 加強檢查
	4 開挖土方堆置或工區廢料處理是否妥當?	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 加強檢查
	5 支撐超過一層是否設置固定樓梯做為上下設備?	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 加強檢查
	6 簡易工作梯是否安全穩固?	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 加強檢查
	7 操作人員是否取得合格證照(如起重機、堆高機...等)?	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 加強檢查
	8 起重吊鉤是否有防滑舌片，人員不得在吊物下方?	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 加強檢查
	9 吊索及配件之繫結是否有缺陷?	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 加強檢查
	10 地面、牆面及危險地區是否有防護措施及安全標誌?	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 加強檢查
	11 高架作業時是否搭設施工架(含護欄)及繫安全帶(索) 以防人員墜落?	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 加強檢查
	12 用電設備及線路是否安全?	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 加強檢查
	13 有感電之虞作業是否派專人負責監視?	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 加強檢查
	14 施工用電是否裝設適當容量之漏電斷路器並將電纜穩固架設?	<input checked="" type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 加強檢查
	15 電焊機是否裝置自動電擊防止裝置及漏電斷路器?	<input type="checkbox"/> 正常 <input type="checkbox"/> 異常	<input type="checkbox"/> 加強檢查



## 工程主辦機關工程督導紀錄

工程名稱	法務部矯正署彰化看守所遷建統包工程		
主辦機關	法務部矯正署彰化看守所	督導日期	110年7月14日15時
監造廠商	王騰建築師事務所	相關廠商 (專案管理)	正堯工程顧問有限股份公司
承攬統包廠商	宏昇營造股份有限公司 姜樂靜建築師事務所 怡佑有限公司 順晟科技企業有限公司	督導人員	 <small>(委員簽名)</small>
工程執行進度	預定進度	2.0491%	實際進度
			4.6295%
目前施工概況	懇親宿舍 1F 地坪管線配置收尾、澆置完成面標高器設置。		
督導重點項目	一、承商及監造單位到場人員（如出勤簽到記錄等） 督導情形： （一）監造廠商：監造主任、專管助理、監造工程師在工地執行職務，專管經理請假。 （二）統包廠商：工地負責人、品管人員、勞工安全衛生人員在工地執行職務。		
	二、承商及監造單位品質文件記錄管理（如材料試驗、自主檢查、監造日誌、缺失改善等） 督導情形： （一）監造廠商：職安衛管理（土地環境保護、工地安全衛生）、施工查驗確實記錄管理、其餘尚未開始施工項目已列冊。抽查監造報表確實填寫至7月13日。 （二）統包廠商：抽查施工日誌確實填寫至7月13日。		
	三、安衛環境管理（如告示牌、圍籬、警示燈帶、鷹架、開口警示、衛生設備、道路清潔等） 督導情形： 統包廠商： 1. 鋼筋預留筋確實裝置保護套。 2. 部份綠美化植栽枯死。 3. 部份施工人員未依防疫規定配戴口罩。		
	四、結構設備施工品質（如混凝土鋼筋模版品質及完成面平整度及美觀性等） 督導情形： 統包廠商： 1. 現場澆置完成面已設置標高器，可清楚控制混凝土完成高度。 2. 本次施工範圍使用模板標面乾淨、平整。 3. 各區塊鋼筋綁紮間距不甚相同，經查屬規劃不同載重所設計不同綁紮方式。 4. 現場 1F 牆身預留筋（紅漆）及預埋管線（藍漆）清楚標示。		
	五、其他（如居民反映、鄰房處理、變更設計需求等） 督導情形：		

<p>對承攬統包廠商 指示事項</p>	<p>指示事項： 統包商回復： 1. 關於施工人員未依防疫規定配戴口罩，早上工班人員進場時，本工務所已依規定協助工人測量體溫、督促工人掃描 QR CODE 並檢視全體人員配戴口罩後方能進場；因工人於烈日下操作重勞力工作，口罩難免受汗水影響而受潮，工人因此將口罩取下。本工務所已備妥適量備用口罩並告知工班人員隨時取用替換。 2. 有關植栽綠美化，本工務所已於圍籬上方裝設灑水裝置並指派人員固定時間灑水；因 5 月~6 月期間反覆間歇性大雨及烈日曝曬，造成部份植栽因此枯死。本工務所與監造單位 6 月中旬已商討後續，決議於工區內另行培養可替換之植栽(如下圖)，俟氣候因素穩定及新植栽穩定存活後即可改善。</p> 	<p>承商簽認</p>	<p>(工地主任)</p> <p>工地主任黃炫肇 黃炫肇</p>
<p>對監造廠商 指示事項</p>	<p>指示事項： 專管廠商回復： 1. 7 月 14 日早上，本監造單位人員於懇親宿舍工區巡視時，全體人員已配戴口罩，經查統包廠商所提原因屬實，監造單位將督促統包廠商提供備用口罩並告知工班人員隨時取用替換。 2. 監造單位將督促統包廠商於氣候因素穩定及新植栽穩定存活後進行改善。</p>	<p>監造簽認</p>	<p>(監造主任)</p> <p>監造主任王仁和 王仁和</p>
<p>主辦機關核章</p>	<p>承辦人員 總務科長 管理員許晏豪 總務科長張錦倉</p>	<p>機關首長 秘書 110. 7. 19 韓保貴(代)</p>	

請假單

有關法務部矯正署彰化看守所遷建工程

「委託專案管理(含地質鑽探)及監造技術服務」案  
本公司專案經理朱俊銘因個人因素，須於七月十四日  
請假一日。

惠請同意准假

此致


法務部矯正署彰化看守所

正堯工程顧問股份有限公司

請假人 朱俊銘


代理人 王仁和

中華民國 110 年 7 月 13 日





## 工程主辦機關工程督導紀錄

工程名稱	法務部矯正署彰化看守所遷建統包工程			
主辦機關	法務部矯正署彰化看守所	督導日期	110年7月21日15時	
監造廠商	王騰建築師事務所	相關廠商 (專案管理)	正堯工程顧問有限股份公司	
承攬統包廠商	宏昇營造股份有限公司 姜樂靜建築師事務所 怡佑有限公司 順晟科技企業有限公司	督導人員	 <small>(委員簽名)</small>	
工程執行進度	預定進度	2.1201%	實際進度	4.7005%
目前施工概況	主體工區洗車池及勞工休息區混凝土澆置。			
督導重點項目	一、承商及監造單位到場人員（如出勤簽到記錄等） 督導情形： （一）監造廠商：專管經理、監造主任、專管助理、監造工程師在工地執行職務。 （二）統包廠商：工地負責人、品管人員、勞工安全衛生人員在工地執行職務。			
	二、承商及監造單位品質文件記錄管理（如材料試驗、自主檢查、監造日誌、缺失改善等） 督導情形： （一）監造廠商：職安衛管理（土地環境保護、工地安全衛生）、施工查驗確實記錄管理、其餘尚未開始施工項目已列冊。抽查監造報表確實填寫至7月20日。 （二）統包廠商：抽查施工日誌確實填寫至7月20日。			
	三、安衛環境管理（如告示牌、圍籬、警示燈帶、鷹架、開口警示、衛生設備、道路清潔等） 督導情形： 統包廠商：部份安全圍籬（臨彰監）受強風吹襲倒塌。			
	四、結構設備施工品質（如混凝土鋼筋模版品質及完成面平整度及美觀性等） 督導情形： 統包廠商：無異樣。			
	五、其他（如居民反映、鄰房處理、變更設計需求等） 督導情形：無			





缺失改善照片表 (改善前、中、後同一角度拍攝)



說明：  
改善前-部份安全圍籬(臨彰監)  
受強風吹襲倒塌。



說明：  
改善中-立即派員扶正及臨時固  
定，俟颱風過後加強固  
定。



說明：  
改善後-扶正及臨時固定完成。
